


Informationen zu aktuellen Schulbauprojekten


moderne Verwaltung **PM**

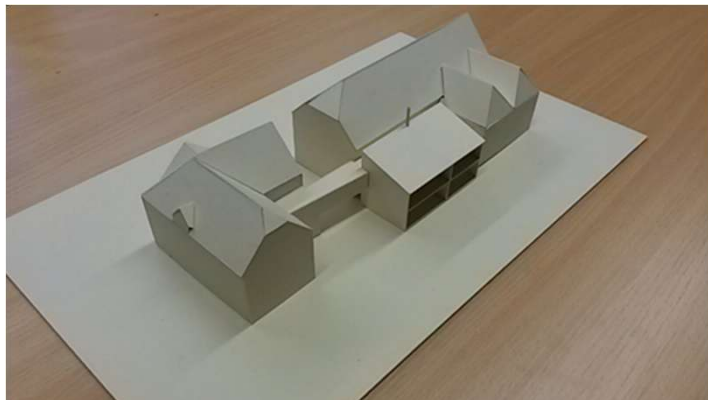

Projekt: **Neubau Sporthalle**

Zweifeldsporthalle, Schulerweiterung
für Aula, Cafeteria und Musikraum

- 1.BA und 2.BA der Außenanlagen für die Schule freigegeben, weitere arbeiten laufen im Plan
- Restleistung Elektro in den Herbstferien

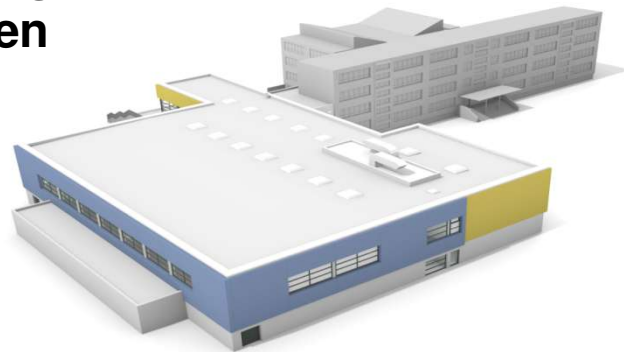


- **Geplante Kosten: 7.718,5 T€**
- **Bauzeit: 2013-2017**



Projekt: **Pavillonneubau**

3 Unterrichtsräume

- Dämmarbeiten und Fliesenarbeiten sind abgeschlossen
 - Abgehängte Decken, Türzargen und Lüftungsgerät sind eingebaut
 - HLS- und Elektroarbeiten laufen nach Plan
-
- Fertigstellung: Nov.-Dez. 2017
 - Geplante Kosten: 1.235 T€
 - Bauzeit mit Planung: 2014-2017

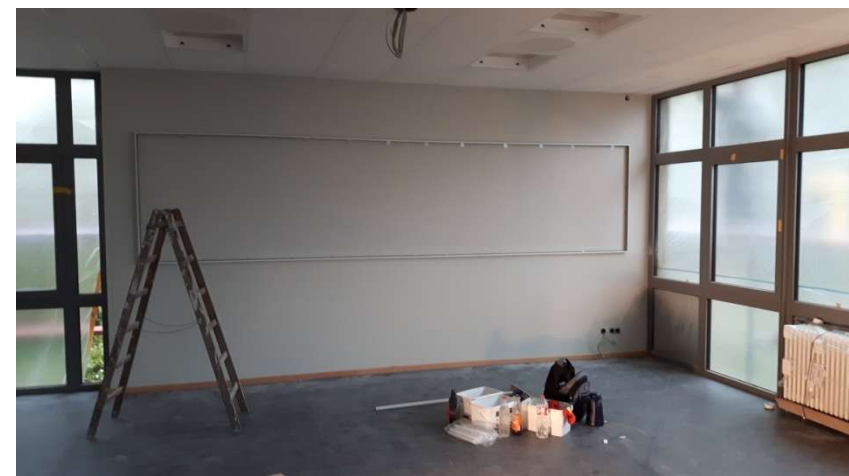

Projekt: **Hauptgebäude**
Sanierung und Raumoptimierung

- Bauantrag wird vorbereitet
- Abbrucharbeiten sind abgeschlossen



- Geplante Kosten: 2.160 T€
- Plan- und Bauzeit:
2015-2018

